

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ DEFEKTINIS AKTAS

Adresas: Liepų g. 5, Kvietiniai, Klaipėdos r. sav.

Būsto priežiūros vadybininkė: Ligita Šunokienė


Problema: laiptinės langai, nesandarūs mediniai.

Numatomi atlikti darbai			
Eil. nr.	Darbai	Mato vnt.	Kiekis
1.	Senų langų demontavimas	Vnt	2
2.	Senų palangių demontavimas	Vnt	2
3.	Palangės demontavimas (tarpas tarp langų)	M3/m2	0,2/0,55
4.	Naujo lango įrengimas	Vnt	1
5.	Lauko palangės įrengimas	Vnt	1
6.	Apdailos įrengimas iš lauko ir vidaus	M2	4
7.	Darbo vietos susitvarkymas, gruzo išvežimas	Kompl.	1

Lango matmenys 1,75 m. x 0,85m.

Palangės aukštis 30cm.

Prieš užsakant gaminius rangovas išsimatuoja papildomai. Langų spalva numatoma balta.

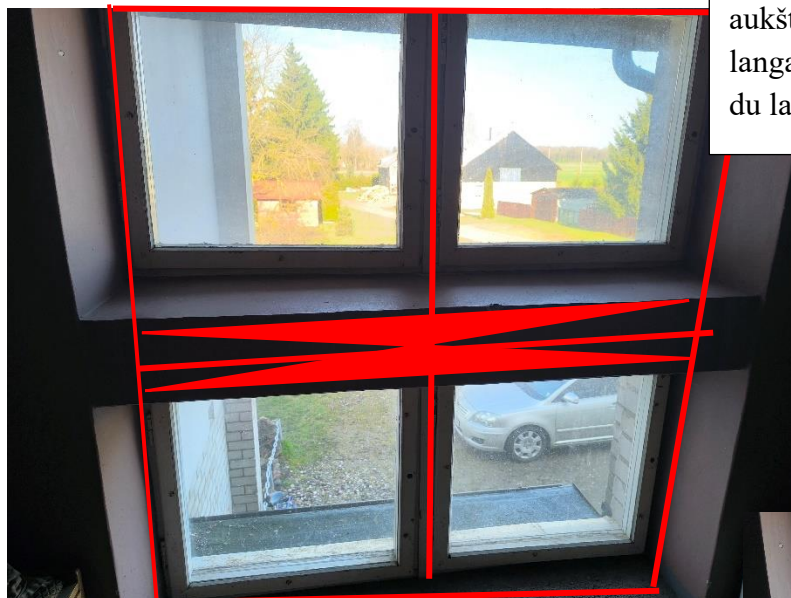

Demontuojamas tarpas tarp langų (30cm aukštis) įrengimas vienas didelis langas(padalintas į keturias dalis), viršuje du langai varstomi.

